

**Faktúra číslo :****20190052**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

Kaping s.r.o.

Budovateľská 50  
080 01 PREŠOV  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36655651

DIČ: 2022220453

IČ DPH: SK2022220453

Firma zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 17613/P

Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Prešov

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: 0908 781 598

Faktúru vyhotovil :

Mgr. Bučková Helena

**Odberateľ :**

Obec Vavrinec

Vavrinec 2

094 31 Vavrinec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00332909

DIČ: 2020630557

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:****Obec Vavrinec**  
Vavrinec 2  
094 31 Vavrinec

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.09.2019

31.08.2019

**02.10.2019**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobne**Číslo účtu : **6628567018/1111**IBAN : **SK20 1111 0000 0066 2856 7018**Suma k úhrade : **12 559,44**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**20190052****0308**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám stavebné práce v zmysle "Zmluvy o dielo č. 05/11/2017 zo dňa 28.11.2017" a na základe súpisu vykonaných prác na stavbe "Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec"**  
**Objekt : SO 01 Rekonštrukcia administratívnej budovy**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		stavebné práce za mesiac august 2019	1,00		10 466,20	12 559,44	20	10 466,20	2 093,24	12 559,44

Základ pre DPH 20 % : 10 466,20

DPH 20 % : 2 093,24

**Celková suma s DPH****12 559,44****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****12 559,44**

 **KAPING s.r.o.**  
 Budovateľská 50, PREŠOV, IČO: 36655651  
 Ing. IMRICH MIŠKUF - konateľ

Podpis a pečiatka :

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.8.2019

Číslo faktúry:  
Počet príloh: 0

**ZHOTOVITEĽ**

Kaping s.r.o  
sídlo: Budovateľská 50  
Prešov

IČO: 36655651  
IČ DPH: SK2022220453

**OBJEDNÁVATEĽ**

Obec Vavrinec  
sídlo: Vavrinec 2  
Hanušovce nad Topľou

IČO: 00332909  
IČ DPH:

Stavba: Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec  
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia administratívnej budovy  
JKSO:  
Miesto:

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu			125 559,05
		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	101 827,50	10 466,20	112 293,70
3.	DPH	20 365,50	20,00 % 2 093,24	22 458,74
4.	<b>Celkom (2+3)</b>	<b>122 193,00</b>	<b>12 559,44</b>	<b>134 752,44</b>
5.	Zádržné		0,00 % 0,00	
6.	Pozastávka		0,00 % 0,00	
7.	<b>K úhrade (4-5-6)</b>		<b>12 559,44</b>	

### VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

  
Budovateľská 50, PREŠOV, IČO: 366  
LADISLAV JARKOVSKÝ - stavby  
podpis

Za objednávateľa:

podpis

V Prešove

Dátum: 2. 9. 2019

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

**Obdobie:** 1.-31.8.2019

Názov stavby	Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Rekonštrukcia administratívnej budovy	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Vavrinec	00332909	
Projektant			
Zhotoviteľ	Kaping s.r.o	36655651	SK2022220453
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		02.09.2019	CPA

## Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 7 200,00	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 266,20	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 10 466,20	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 10 466,20	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 10 466,20 2 093,24	
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 12 559,44</b>	
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Dátum a podpis				27 Kízavá doložka 0,00	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

  
**KAPING s.r.o.**  
 Budovateľská 50, PŘEŠOV, IČO: 36655651  
 LADISLAV JARKOVSKÝ - stavbyvedúci


# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ČERPANIA

Stavba: Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrince  
 Objekt: SO 01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Časť:

Názov objednávateľa: Obec Vavrince

Názov zhotoviteľa: Kaping s.r.o

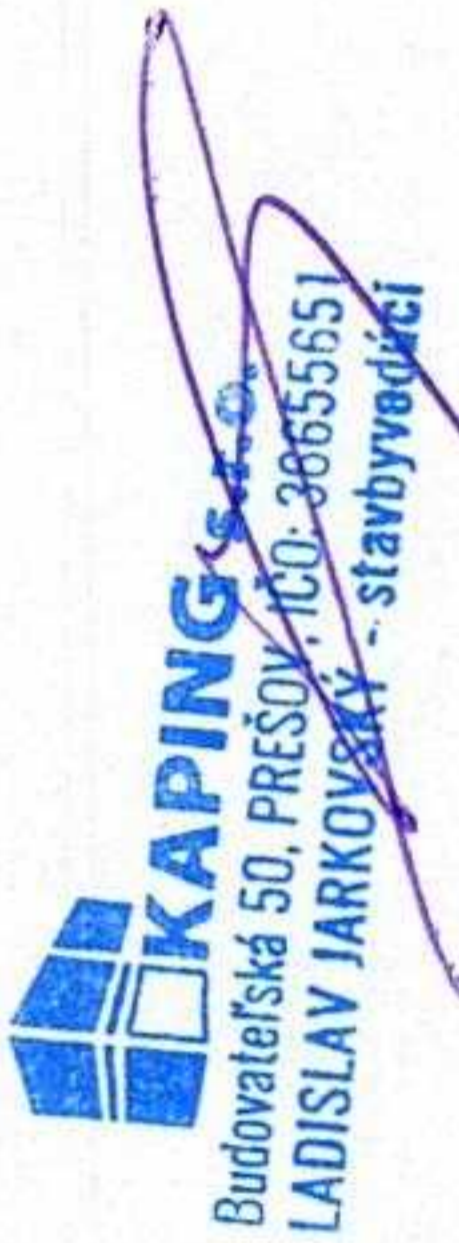

Obdobie: 1.-31.8.2019

Spracoval:

Dátum: 2.9.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Úplný popis	MJ	Množstvo z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu (€)	Výkon za sledované obdobie (MJ)	Cena celkom za sledované obdobie (€)	Prestavané množstvo zahŕňajúce (MJ)	Prestavané množstvo od zahŕňajúceho nákladu (€)	Výkon a prestavané množstvo (MJ)	Výkon a prestavané náklad (€)	Zostatok množstvo (MJ)	Zostatok náklad (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

D1 Práce HSV										0,00	37 143,69	37 143,69	584,82		
D2 ZEMNÉ PRÁCE										0,00	0,00	0,00	0,00		
1 R	139711101		Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný	m3	10,830	34,21	370,49	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,830	370,49
2 R	162701105		prostriedok v hornine 1 až 4-ryhy pre ZTI	M3	10,830	6,54	70,83	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,830	70,83
3 R	175101101		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	10,830	13,25	143,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,830	143,50
D3 ZVISLE KONSTRUKCIE										0,00	8 755,78	8 755,78	0,00		
4 R	311272104		Murivo nosné z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.240	M3	5,330	128,47	684,75	0,000	0,00	5,330	684,75	5,330	684,75	0,000	0,00
5 R	311272109		Murivo nosné z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.300	M3	42,138	130,32	5 491,42	0,000	0,00	42,138	5 491,42	42,138	5 491,42	0,000	0,00
6 R	314293020		Kominové teleso z kominových tvaroviek DN 20 1 prieduch	m	7,570	94,63	716,35	0,000	0,00	7,570	716,35	7,570	716,35	0,000	0,00
7 R	314295704		Kominová nadstrešná obmurovka jednopriechodový tehľami Dn 20cm	m	1,300	155,00	201,50	0,000	0,00	1,300	201,50	1,300	201,50	0,000	0,00
8 R	314295764		Prefabrikovaná krákorcová doska bez vetracej šachty, komin jednopriechodový Dn 20cm	ks	1,000	98,46	98,46	0,000	0,00	1,000	98,46	1,000	98,46	0,000	0,00
9 R	342272104		Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 150 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	89,026	15,37	1 368,33	0,000	0,00	89,026	1 368,33	89,026	1 368,33	0,000	0,00
10 R	342272121		Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.100, P2-500	m2	15,021	12,98	194,97	0,000	0,00	15,021	194,97	15,021	194,97	0,000	0,00
D4 VODOROVNÉ KONSTRUKCIE										0,00	1 244,32	1 244,32	0,00		
11 R	417321515		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	4,841	94,73	458,59	0,000	0,00	4,841	458,59	4,841	458,59	0,000	0,00
12 R	417351115		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	39,885	6,38	254,47	0,000	0,00	39,885	254,47	39,885	254,47	0,000	0,00
13 R	417351116		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	39,885	2,50	99,71	0,000	0,00	39,885	99,71	39,885	99,71	0,000	0,00
14 R	417361821		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,411	1 049,99	431,55	0,000	0,00	0,411	431,55	0,411	431,55	0,000	0,00
D5 UPRAVA POVRCHOV										0,00	12 049,55	12 049,55	0,00		
15 R	611421992		Penetrácia podkladu stropu-1.PP	M2	70,120	1,20	84,14	0,000	0,00	70,120	84,14	70,120	84,14	0,000	0,00
16 R	611473112		Vnútrná omietka vápenocementová zo suchých zmesí stropov - 1.PP ozn.N01 - štuková	m2	70,120	6,98	489,44	0,000	0,00	70,120	489,44	70,120	489,44	0,000	0,00
17 R	612401992		Penetrácia podkladu pred omietkou stien-1PP	M2	197,527	0,90	177,77	0,000	0,00	197,527	177,77	197,527	177,77	0,000	0,00
18 R	612401992.1		Penetrácia podkladu pred omietkou-1.NP	M2	334,647	0,90	301,18	0,000	0,00	334,647	301,18	334,647	301,18	0,000	0,00
19 R	612462431		Vnútrná sanačná omietka stien hr. 20 mm-1.PP- ozn.N02	m2	129,810	13,32	1 729,07	0,000	0,00	129,810	1 729,07	129,810	1 729,07	0,000	0,00
20 R	612473182		Vnútrná omietka vápenocement. zo suchých zmesí muriva druhu, štuková-1.PP- ozn.N01	m2	67,582	8,00	540,66	0,000	0,00	67,582	540,66	67,582	540,66	0,000	0,00
21 R	612474101		Vnútrná omietka stien maltou zo zmesi hr. 8 mm - 1NP	m2	334,647	7,22	2 416,15	0,000	0,00	334,647	2 416,15	334,647	2 416,15	0,000	0,00
22 R	612481119		Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou vtlačeníých do tmelu-1.NP	m2	334,647	2,98	997,25	0,000	0,00	334,647	997,25	334,647	997,25	0,000	0,00
23 R	631315611		Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,995	92,00	367,54	0,000	0,00	3,995	367,54	3,995	367,54	0,000	0,00
24 R	631315661		Podkladný betón z betónu tr. C20/25 hr.150mm-nepodpivničená časť	m3	8,910	95,00	846,45	0,000	0,00	8,910	846,45	8,910	846,45	0,000	0,00
25 R	631361921		Výstuž podkladného betónu zo zváraných sietí z drôtov oceľových t'ahaných	t	0,321	1 199,99	385,20	0,000	0,00	0,321	385,20	0,321	385,20	0,000	0,00
26 R	632451034		Vyrovnávací cementový poter podláh hr 50 mm- TERASA 1.PP	m2	26,430	7,55	199,55	0,000	0,00	26,430	199,55	26,430	199,55	0,000	0,00
27 R	632451045		Samonivelizujúci poter hr.7mm-P1+P2+P3+P4+P5	M2	233,480	6,00	1 400,88	0,000	0,00	233,480	1 400,88	233,480	1 400,88	0,000	0,00
28 R	632451054		Poter pieskovocementový hr.35-55mm P6	m2	13,280	7,36	97,74	0,000	0,00	13,280	97,74	13,280	97,74	0,000	0,00
29 R	632451055		Poter pieskovocementový hr. do 50 mm - P4+P5	m2	157,980	8,42	1 330,19	0,000	0,00	157,980	1 330,19	157,980	1 330,19	0,000	0,00
30 R	632451199		Penetrácia podkladu P1-P6	M2	268,940	0,95	255,49	0,000	0,00	268,940	255,49	268,940	255,49	0,000	0,00
31 R	642991721		Osadzovanie obložkovej zárubne - ozn.P/6, L/6, P/7	KUS	9,000	13,55	121,95	0,000	0,00	9,000	121,95	9,000	121,95	0,000	0,00
32 R	622462004		Sanačná omietka vápenná systém s jadrom-1.PP ozn.N02	m2	12,128	25,47	308,90	0,000	0,00	12,128	308,90	12,128	308,90	0,000	0,00







